

# Nieuwsbrief Reconstructie F35 Bankastraat Hengelo

In opdracht van de gemeente Hengelo zijn wij, Lansink Wegenbouw, bezig met werkzaamheden in uw buurt. De werkzaamheden hebben invloed op de parkeergelegenheid in uw straat en de bereikbaarheid van uw woning.

## De werkzaamheden

De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Langs de Bankastraat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Tevens gaan wij riolering vervangen en/of onderhouden. Nadere projectinformatie is digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Hengelo: <https://www.hengelo.nl/Bankastraat>


## Start werkzaamheden fase 8

Zoals eerder gecommuniceerd, lopen de werkzaamheden van Visser & Smit Hanab aan de kabels en leidingen aanzienlijk uit. De vertraging is inmiddels opgelopen tot negen weken, waardoor Visser & Smit Hanab verwacht haar werkzaamheden af te ronden in week 21. Vanwege de impact op de bereikbaarheid van de omliggende wijk, kunnen wij niet starten met fase 5 zoals gepland. Om toch voortgang te houden in onze werkzaamheden, hebben we gekozen voor een alternatieve fasering. Daarom wordt fase 8 nu eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.

We starten woensdag 22 mei met de werkzaamheden in fase 8 en verwachten deze, mits de weersomstandigheden het toelaten, medio juli te hebben afgerond. Fase 8 betreft het hofje aan de Bankastraat ter hoogte van huisnummer 22 t/m nummer 60. De bestaande verharding wordt opgebroken zodat de nieuwe riolering aangelegd kan worden. Vervolgens wordt het nieuwe voetpad gerealiseerd. De aanliggende panden blijven te voet altijd bereikbaar via de bestaande voetpaden en/of getroffen loopvoorzieningen. Let op dat binnen het werkvak gewerkt wordt door onze werknemers en met groot materieel. In figuur 1 op de andere zijde van deze is het werkgebied van fase 8 geel gearceerd.

## Parkeren Bankastraat

Tijdens onze werkzaamheden moeten we vanaf de Bankastraat met ons materieel materialen aan- en afvoeren voor fase 8. We vragen u vriendelijk om geen auto's te parkeren aan de Bankastraat, ter hoogte van het hofje. Daarom verzoeken wij u om uw auto op woensdag 22 mei vóór 7:30 uur buiten ons werkgebied te plaatsen.

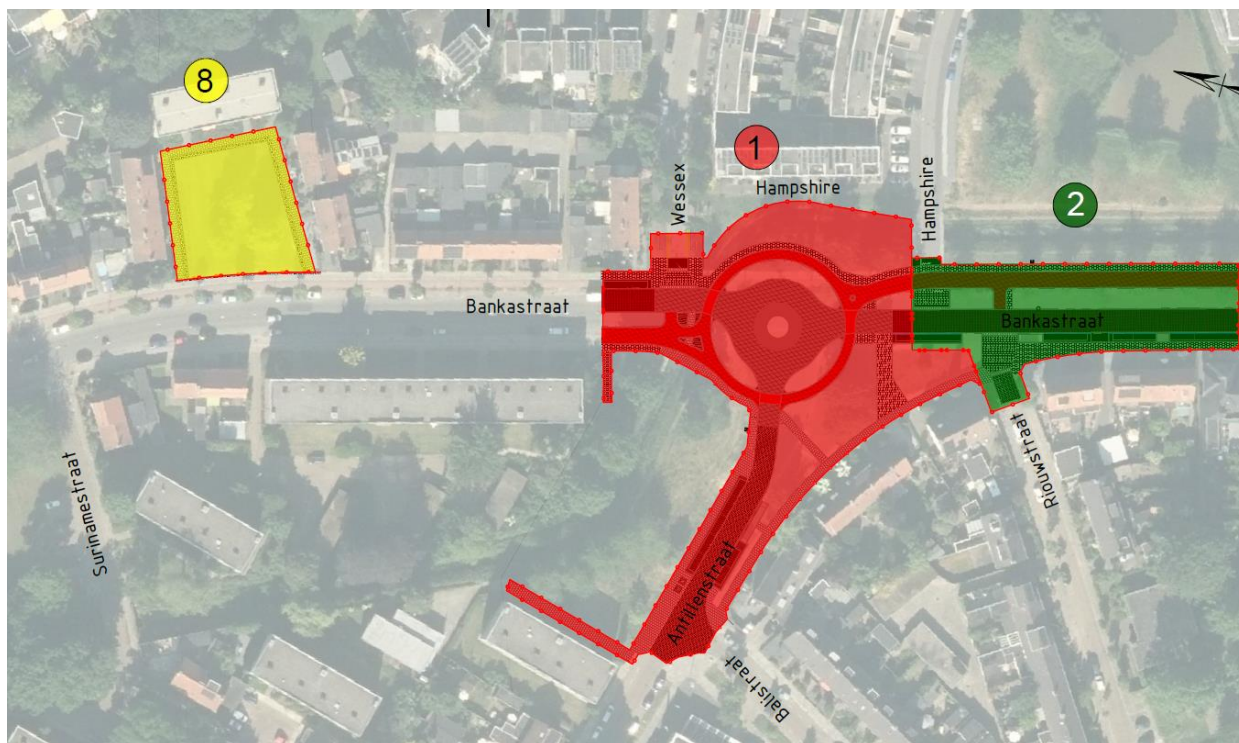

Figuur 1, Het werkgebied van fase 8 is geel gearceerd.

## Vragen/klachten/opmerkingen

U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks via de BouwApp volgen. Heeft u nog vragen? neem dan contact op met Lansink Wegenbouw. Dit kan heel eenvoudig, op de volgende manieren:

- Via de BouwApp kunt u een opmerking maken of een vraag stellen onder het kopje “contact”;
- Heeft u vragen over uw bereikbaarheid en over onze planning? Of wilt u graag extra informatie over onze werkzaamheden? Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, Bart van der Neut. Hij is regelmatig op het werk aanwezig en hij is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06–23 85 49 02.
- Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Han Bootsveld. Han is dagelijks op het werk aanwezig en is telefonisch bereikbaar op 06 – 21 46 05 87.



## Veelgestelde vragen

### Wanneer wordt er gewerkt?

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, tussen 7.00 en 18.00 uur. In het weekend en op nationale feestdagen liggen de werkzaamheden stil.

### Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken?

Uw veiligheid staat voorop! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance. De brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskransen en riolering.

### Hoe wordt u geïnformeerd over het verloop van onze werkzaamheden?

De overige informatie delen wij in de BouwApp. Mocht u geen gebruik van de BouwApp willen maken maar wilt u wel geïnformeerd worden, vragen wij u om dit per email te melden aan [c.kraesgenberg@lansink-wegenbouw.nl](mailto:c.kraesgenberg@lansink-wegenbouw.nl)
